

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事

令和5年10月号・11月号

浸水対策


工事状況おしらせ

※ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

📍 受注者：(3工区)大豊・森本・濱崎特定JV

(4工区)鴻池・新井・九州環境特定JV

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

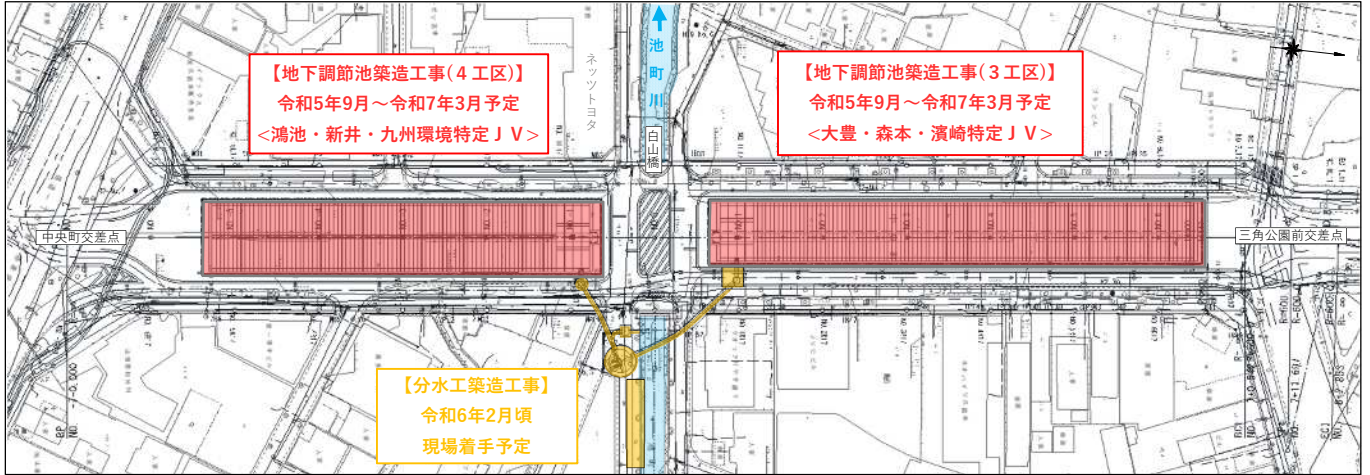

掘削工(土を掘り場外へ搬出する工事)を行っています。

10月は地下調節池築造工事(3工区)において、仮設工(支柱を地中に入れる工事)を行い、その後に掘削工を行いました。(地下調節池築造工事(4工区)は準備工)

11月も引き続き掘削工を行い、掘削後に地上で作業を行うための覆工板を設置します。



大型車両(トレーラー、ダンプトラック等)の出入りが発生しますが、地域の安全確保に努めて参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

10月の工事進捗

■ 施工中 ■ 施工完了



仮設作業状況

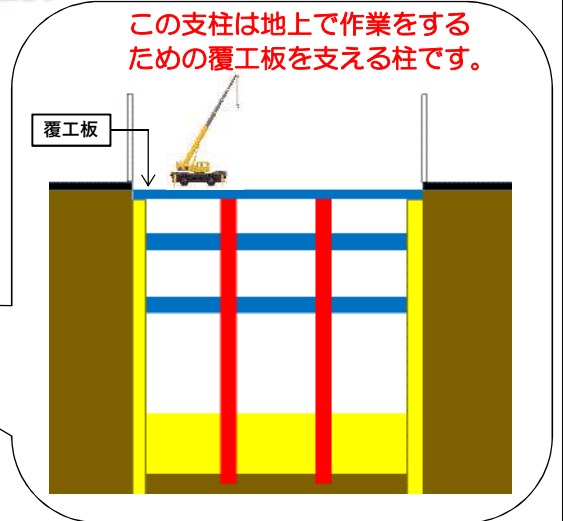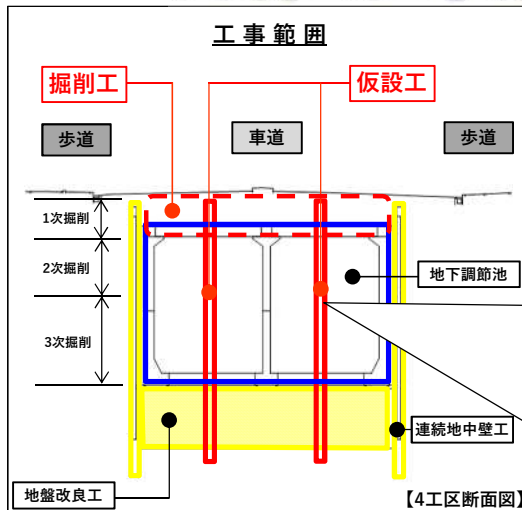

11月の工事予定内容

主な工事として掘削工、覆工板設置を行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
掘削工 (土を掘り場外へ搬出する工事)		地下調節池 (3工区)		1次掘削		大型車の出入りがあります。 (最大70台/日)
覆工板設置						大型車の出入りがあります。 (最大10台/日)
準備工 (資機材搬入)		地下調節池 (4工区)				

関連情報は
こちら

