


浸水対策

7月の工事状況おしらせ


発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：西松・時里特定JV

池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事

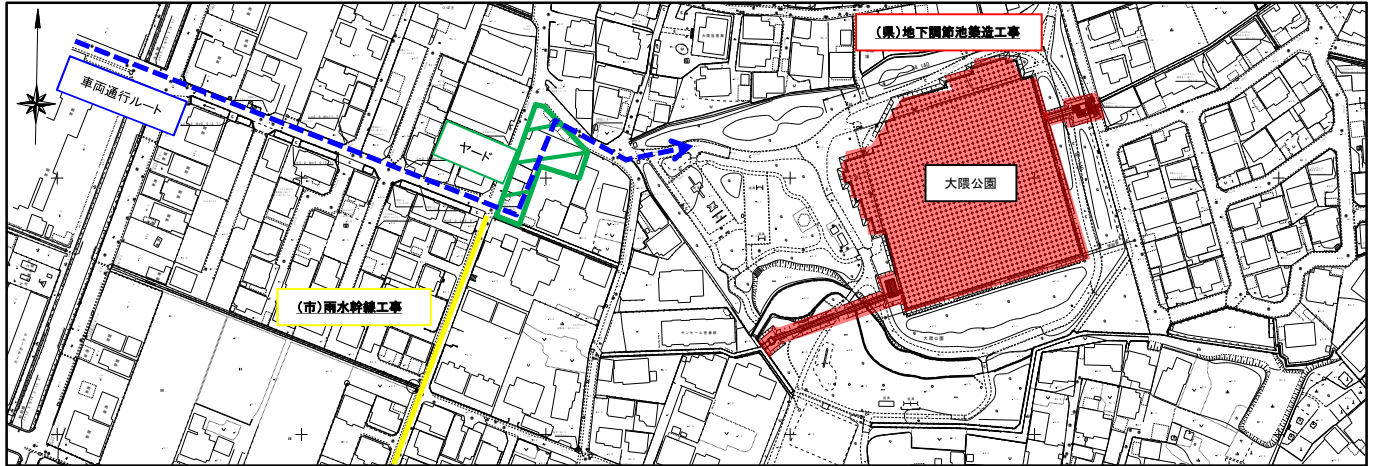

貯留施設工 進捗

～今月のトピック～

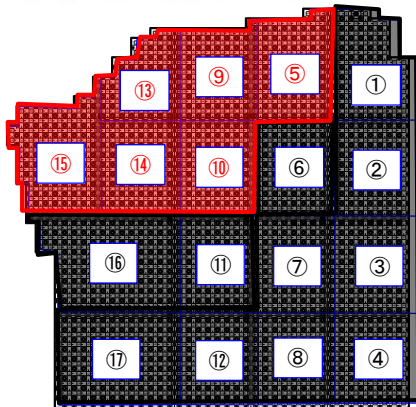

■ 施工済
 ■ 施工中

緊急貯留を行いました

7/10（金）の大雨の際、施工途中ではありましたが、雨水の一時貯留を行い、概ね5cmの浸水軽減効果を発揮しました。

※貯留状況



R5.7.10

貯留施設の設置を行っています

7月は、⑥⑪⑬ブロックの貯留施設の設置を行いました。8月も引き続き、設置を行っていきます。また、資材の運搬に伴うダンプトラックの通行及びコンクリート打設に伴う生コン車の通行があります。今後も安全に十分配慮し、工事を進めていきますので、工事へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

8月の工事予定内容

・引き続き、貯留施設の設置を行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
貯留施設工		大隈公園				資材及び生コン運搬のために、ダンプトラックと生コン車が毎週通行します。

関連情報は
こちら

