


## 浸水対策


# 11月の工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所  
 受注者：西松・時里特定JV

池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事

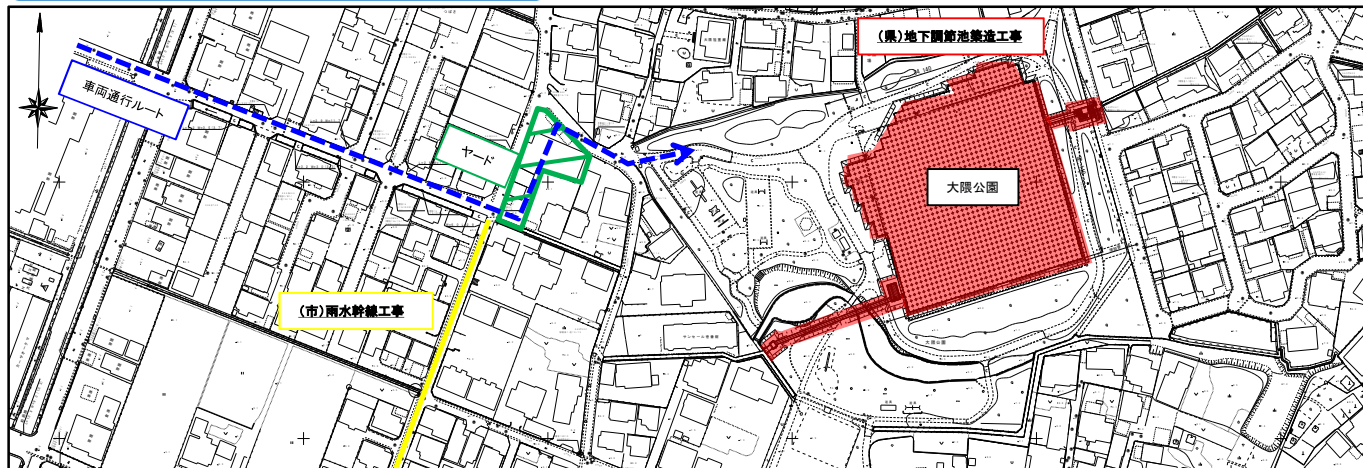

## 貯留施設工 進捗

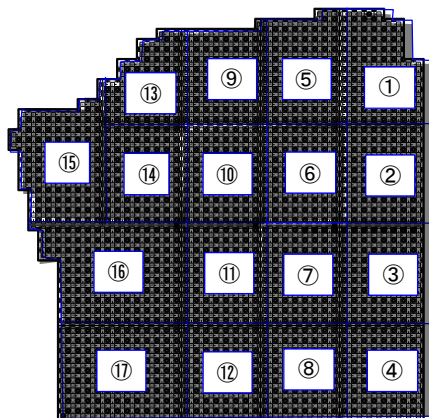

■ 施工済  
 ■ 施工中

### △埋戻し作業を引き続き行います

11月は、グラウンドの埋戻し作業を行いました。  
 12月は、引き続きグラウンドの埋戻し作業を行っていきます。  
 また、土の運搬に伴う**ダンプトラックの通行**があります。  
 今後も安全に十分配慮し、工事を進めていきますので、  
 工事へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。



貯留施設の設置を行いました  
 ブロックごとに設置を行っており、  
 全ブロックの施工が完了しました！

## 12月の工事予定内容

※R5.11月末時点

・引き続き、貯留施設の設置及びグラウンドの埋戻しを行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
埋戻し工		大隈公園				土の運搬のために、ダンプトラックが毎週通行します。

関連情報は  
 こちら

